

Ausbildungsnachweis	Nummer 13	Name Mustermann, Martin
Woche vom/bis 02.12.2013 - 08.12.2013	Ausbildungsjahr 1	Ausbildungsabteilung

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterweisungen, Überbetrieblicher Unterricht, Berufsschule usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Mitwirken beim Mauern von Mauerecken	7,5	8
	Besprechen der Arbeitsregeln für das Mauern v. Ecken 36,5/24cm aus DF-Steinen im 1/2 Verband	0,5	
	(Baustelle Musterdorf, 1-Familienh.)		
Dienstag	Mitwirken beim Mauern von Mauerecken Besprechung und Handhabung der Hochmaßplatten		8
	(Baustelle Musterdorf, 1 Familienh.)		
Mittwoch	Mitwirken beim Herstellen von 36,5cm dicken Wänden	3	8
	Mitwirken bei der Reparatur der Mörtelmischmaschine mit Reinigung und Abschmierung	4	
	Unfallverhütungsvorschrift zur Handhabung von Mörtelmischmaschinen (Belehrung)	1	
Donnerstag	Mitwirken beim Herstellen von 36,5cm dicken Wänden aus Steinen im 2 DF- und 3 DF-Format		8
	(Baustelle Fam. Schmidt)		
Freitag	Einschalen von Tür- und Fensterstürzen nach Anweisung	3	8
	Bewehrung der Stürze und vergießen mit Beton	3	
	Aufräumen der Baustelle	2	
Samstag			
		Wochenstunden	


Besondere Bemerkungen	
Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit	
08.12.13 <i>Fred Jurske</i> Datum Unterschrift des Auszubildenden	08.12.13 <i>M. Mustermann</i> Datum Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders

Mauerwerk im Läuferverband (Übung 4)

Beschreibung: Das in der Übung ausgeführte Mauerwerk besteht aus einer 11,5 cm dicken U-förmigen Wand mit 2DF-Steinen aus Kalksandstein im Läuferverband. Der Läuferverband besteht, wenn die Läufer-schichten versetzt übereinander gelegt werden. Das Überbindemaß in Längsrichtung der Mauer entspricht einem halben Stein. Um diese Überbindung zu erreichen, wird in jede zweite Schicht ein halber Stein an das Mauerende gesetzt.

Zeichnung:

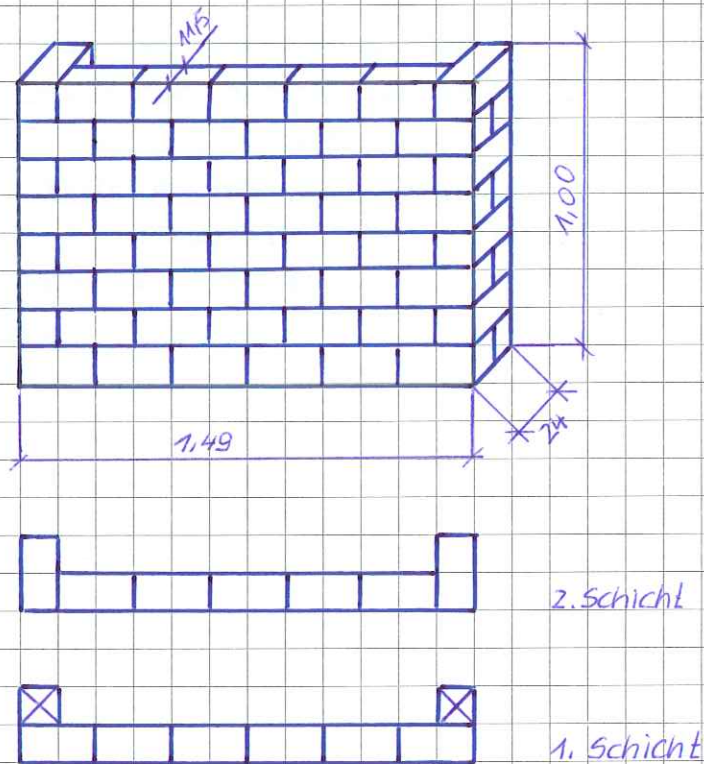

- Arbeitsablauf:**
1. Steine bereitlegen
 2. Mörtel herrichten
 3. Mauerkörper mit Hilfe des Richtscheites und des Gliedermaßstabes anlegen
 4. Erste Schicht als Läufer von rechts nach links mauern
 5. Rechte und linke Ecke auf vier Schicht hoch mauern
 6. Mauern der einzelnen Schichten nach Fluchtschr.
 7. In gleicher Weise die nächsten vier Schichten hoch mauern

Verw. Werkstoffe: 52 Stück 2DF-Steine KSV
8 Stück halbe 2DF-Steine
35 - 40l Mörtel
